


# Raccordement Monophasé

LOCAL ENEDIS

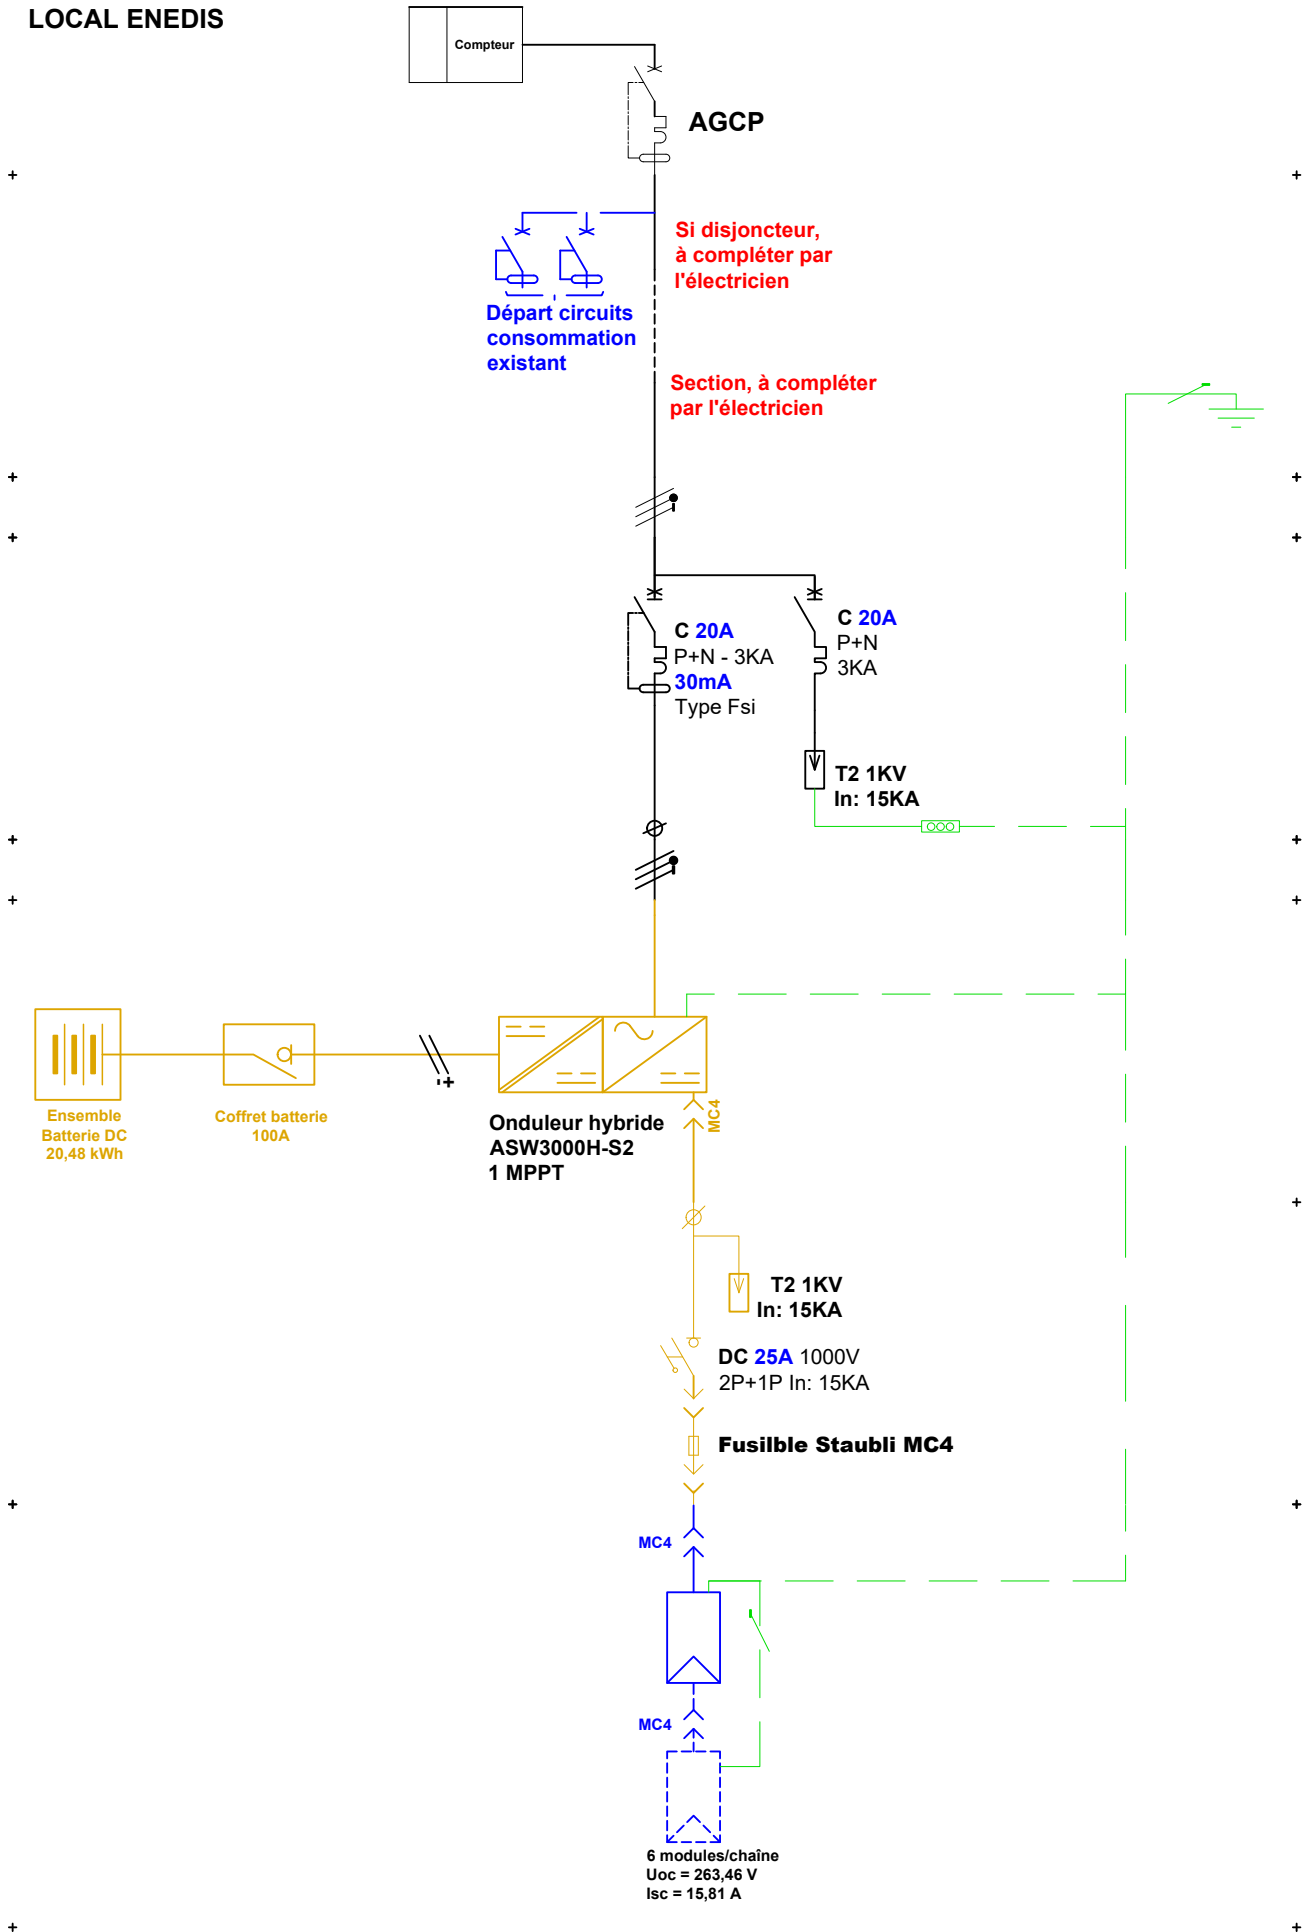

# Modules :

**(6x) HSM-ND54-DR500**  
**3,000 kWc**

Pmpp : **500Wc**

Uoc (-15°C) : **43,91 V**

Isc : **15,81 A**

## Partie DC

(1) Module PV: Le soussigné confirme que les modules sont conformes aux normes de la série NF EN 61730 **6 modules PV (3000 Wc)**

Nombre de chaînes en // : **1 (chaîne de 6)**    Isc max générateur : **15,81 A**    Uoc max : **263,46 V**

(2) Câble Principal PV :    Section : **4 mm<sup>2</sup>**    U : **1500 Vcc**    T° admissible sur âme : **120 °C**

(3a) Interrupteur Sectionneur général DC : Un : **1000 V**    In : **25 A**     Sans objet : Installation avec micro-onduleurs

(3b) Interrupteur-Sectionneur sur le câble batterie (partie distribution DC) : Un : **125 Vdc**    In : **100 A**

Intégré à l'enveloppe comprenant la batterie :  Non     Oui    => Si OUI : Le soussigné s'engage à ce que le dispositif soit conforme aux dispositions de la XP C15-712-3 et de la NF C15-100.

(4) Polarité à la terre :  Non     Oui    Si oui, le soussigné s'engage sur la présence d'une séparation galvanique

(5a) Onduleur :    Si micro-onduleurs / multi-tracker / optimiseur -> Nombre de générateurs identiques : **1**

Marque et modèle : **ASW3000H-S2**    **Monophasé**    Joindre le certificat de conformité à la PRENOME EN 50549-1

## AC

Système Découplage :  Externe     Intégré à l'onduleur

(5c) :  Le soussigné s'engage à s'être assuré du fonctionnement de la protection de découplage dans toutes les configurations du système.

(8) Branchement :  Puissance limitée     Puissance surveillée

## Terre

**(6b) Schéma des Liaisons à la Terre (SLT) en mode autonome (raccordé ou non au réseau) :**

Schéma des Liaisons à la Terre (SLT) mis en oeuvre pour le mode "autonome" :

TT     TN-S     IT sans séparation galvanique (voir aide au remplissage)

Gestion de la mise à la terre en fonction des sources :

Le soussigné s'engage au respect d'un schéma des liaisons à la terre compatible avec l'installation dans toutes les configurations prévues conformément à la partie 4-41 de la NF C15-100.

## Batterie

(7a) Distribution DC ou batterie Udc : **51,2 Vdc**

(7c) Batterie Li-ion :    Nombre de batterie(s) : **4**

Le soussigné confirme que les batteries sont conformes à la norme de sécurité du produit (ex: NF EN 62619) et leur mise en oeuvre conforme au §421.1 de la NF C 15-100

Local batterie : Le soussigné confirme le respect des dispositions du §14.6.2.3 de la XP C15-712-3

Hors local batterie : Le soussigné confirme le respect des dispositions du §14.6.2.4 de la XP C15-712-3

Si hors local batterie : Energie de stockage totale des batteries :  < 15kWh     > 15kWh

(7d) Autres type de batterie :

Le soussigné confirme que les batteries sont conformes à la norme de sécurité du produit et leur mise en oeuvre conforme au §421.1 de la NF C15-100

Tableau 1 Paramètres	Tableau des caractéristiques de chaque groupe PV (ou chaîne PV dans le cas d'optimiseurs sur modules PV)				
	1	2	3	4	5
A : Nombre de chaînes	<b>1</b>				
B : Type et courant assigné (In) du dispositif de protection sur une chaîne	<b>20 A</b>				
C : Type et courant assigné (In) du dispositif de protection de groupes					
D : Courant assigné du dispositif de protection du câble principal PV	<input checked="" type="checkbox"/> Sans objet <input type="checkbox"/> Oui => Si oui, In :                    ou Assurée par :				
E : Courant assigné du dispositif de protection du câble batterie	In : <b>100 A</b> <input type="checkbox"/> Intégré à une enveloppe contenant la batterie				
F : Courant assigné du dispositif de protection du câble régulateur	<input checked="" type="checkbox"/> Sans objet <input type="checkbox"/> oui => Si oui, In :				
G : Courant assigné du dispositif de protection du câble utilisation DC	<input checked="" type="checkbox"/> Sans objet <input type="checkbox"/> oui => Si oui, In :				
H : Courant assigné du dispositif de protection du câble DC onduleur	<input checked="" type="checkbox"/> Sans objet <input type="checkbox"/> oui => Si oui, In :				
I : Courant assigné du dispositif de protection du coffret distribution DC	<input checked="" type="checkbox"/> Sans objet <input type="checkbox"/> oui => Si oui, In :				
J : Courant assigné du dispositif de protection du câble DC autre source AC	<input checked="" type="checkbox"/> Sans objet <input type="checkbox"/> oui => Si oui, In :				
