


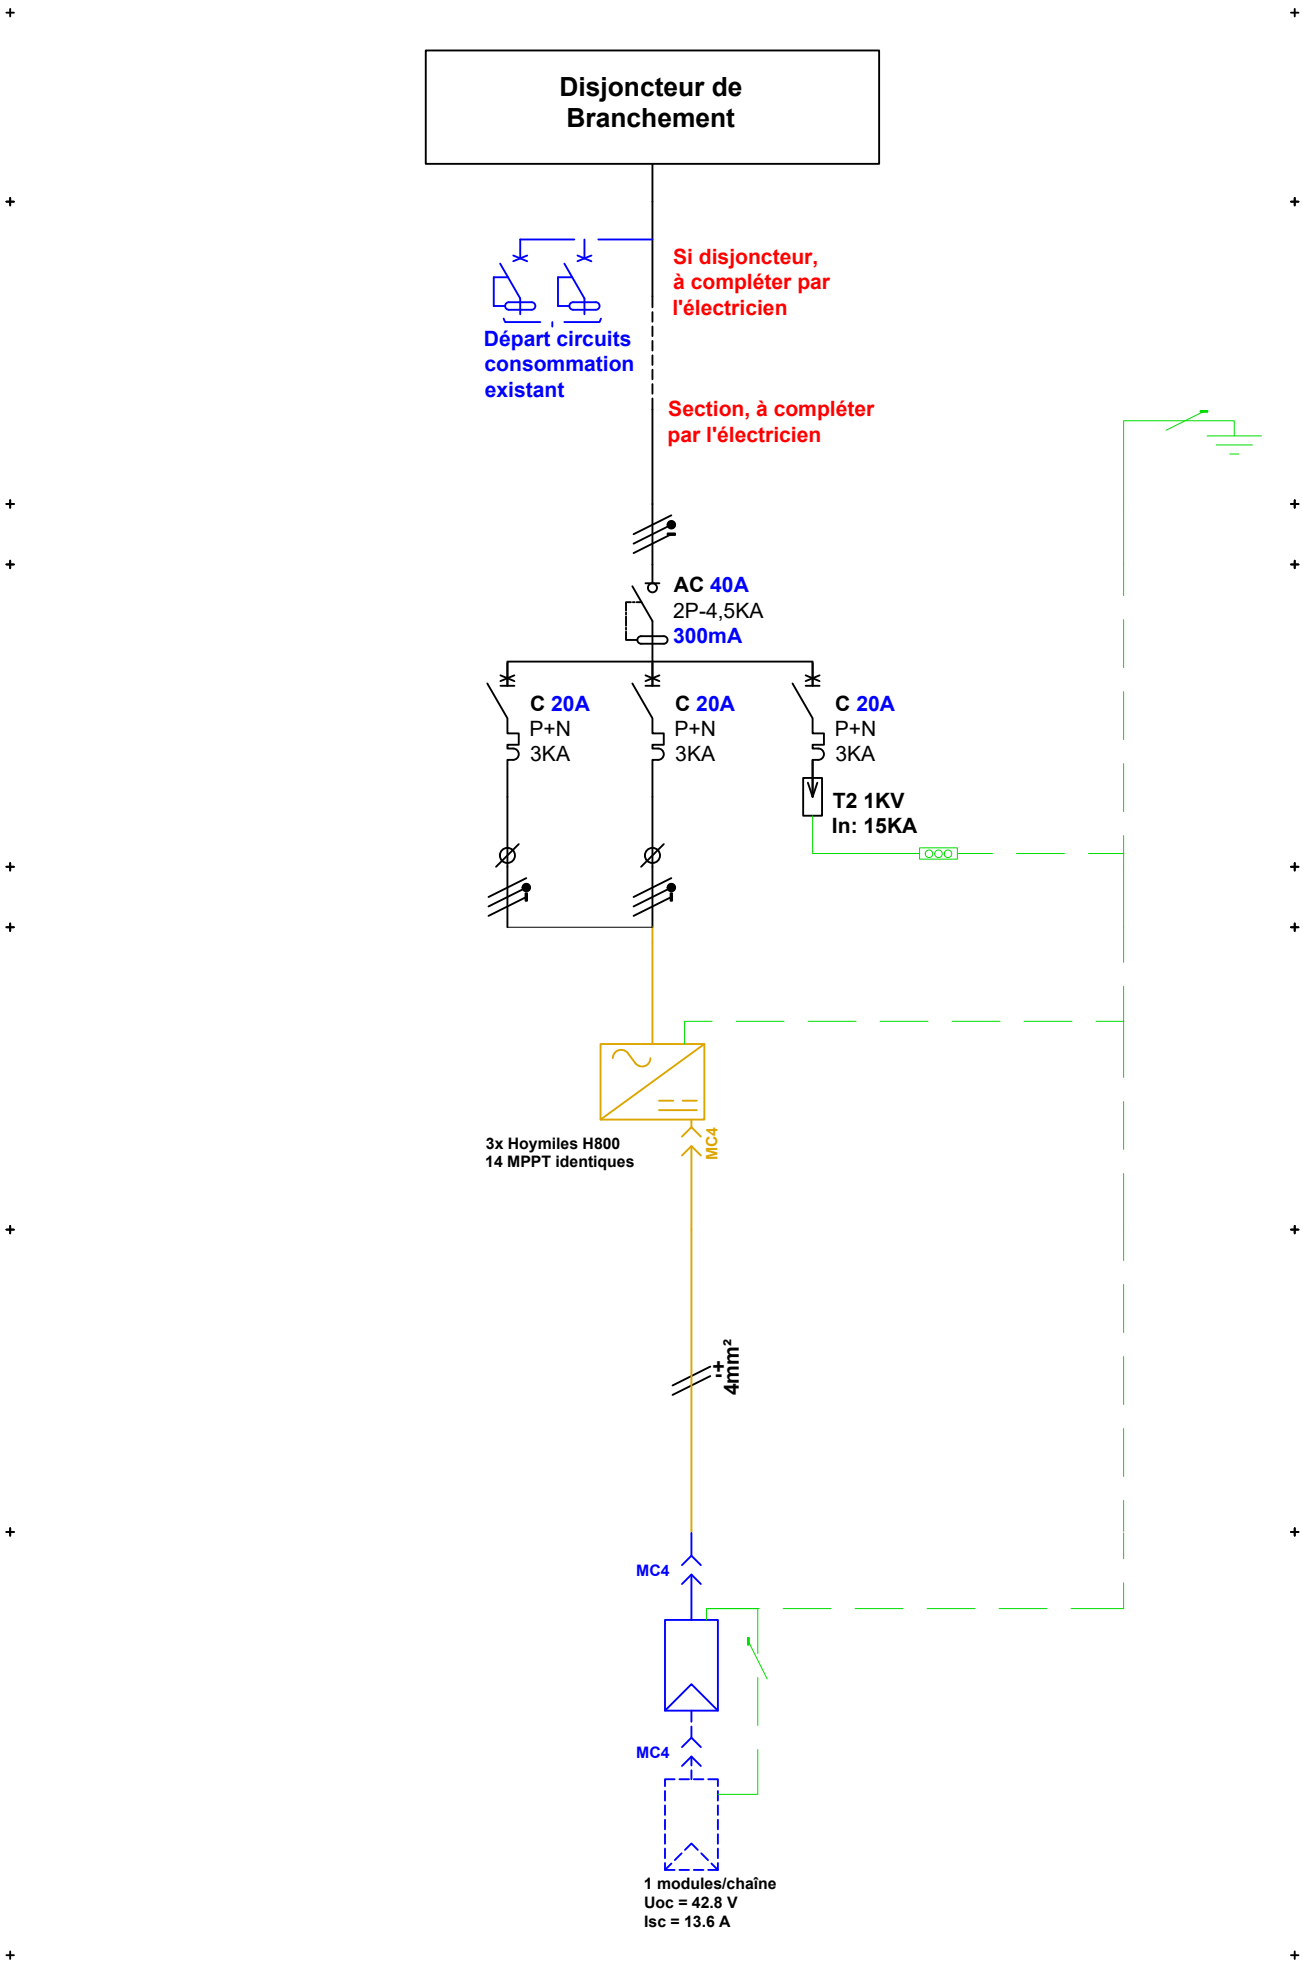

Modules :		(14x) Jinko Tiger Neo 425Wc 5,95 kWc		Pmpp :	425Wc	Uoc (-15°C) :	42.08 V	Isc :	13,6 A
Partie DC	(1) Module PV: Le soussigné confirme que les modules sont conformes aux normes de la série NF EN 61730					14 modules PV (5950Wc)			
	Nombre de chaines en // :		1 (chaîne de 1)	Isc max générateur :		13,6 A	Uoc max :		42,08 V
	(2) Câble Principal PV :		Section :	4 mm²	U :	1500 Vcc	T° admissible sur âme :		120 °C
	(3) Interrupteur Sectionneur général DC : Un :					In :	☒ Sans objet : Installation avec micro-onduleurs		
	(4) Polarité à la terre :		☒ Non	☐ Oui	Si oui, le soussigné s'engage sur la présence d'une séparation galvanique				
	(5) Onduleur :		Si micro-onduleurs / multi-tracker / optimiseur -> Nombre de générateurs identiques :					14	
Partie AC	Marque et modèle :		HMS 800 HOYMILES					Joindre le certificat de conformité à la PRENOME DIN VDE 0126-1-1/A	
	Système Découplage :		☐ Externe	☒ Intégré à l'onduleur					
	(6) Branchement :		☒ Puissance limitée		☐ Puissance surveillée				
