


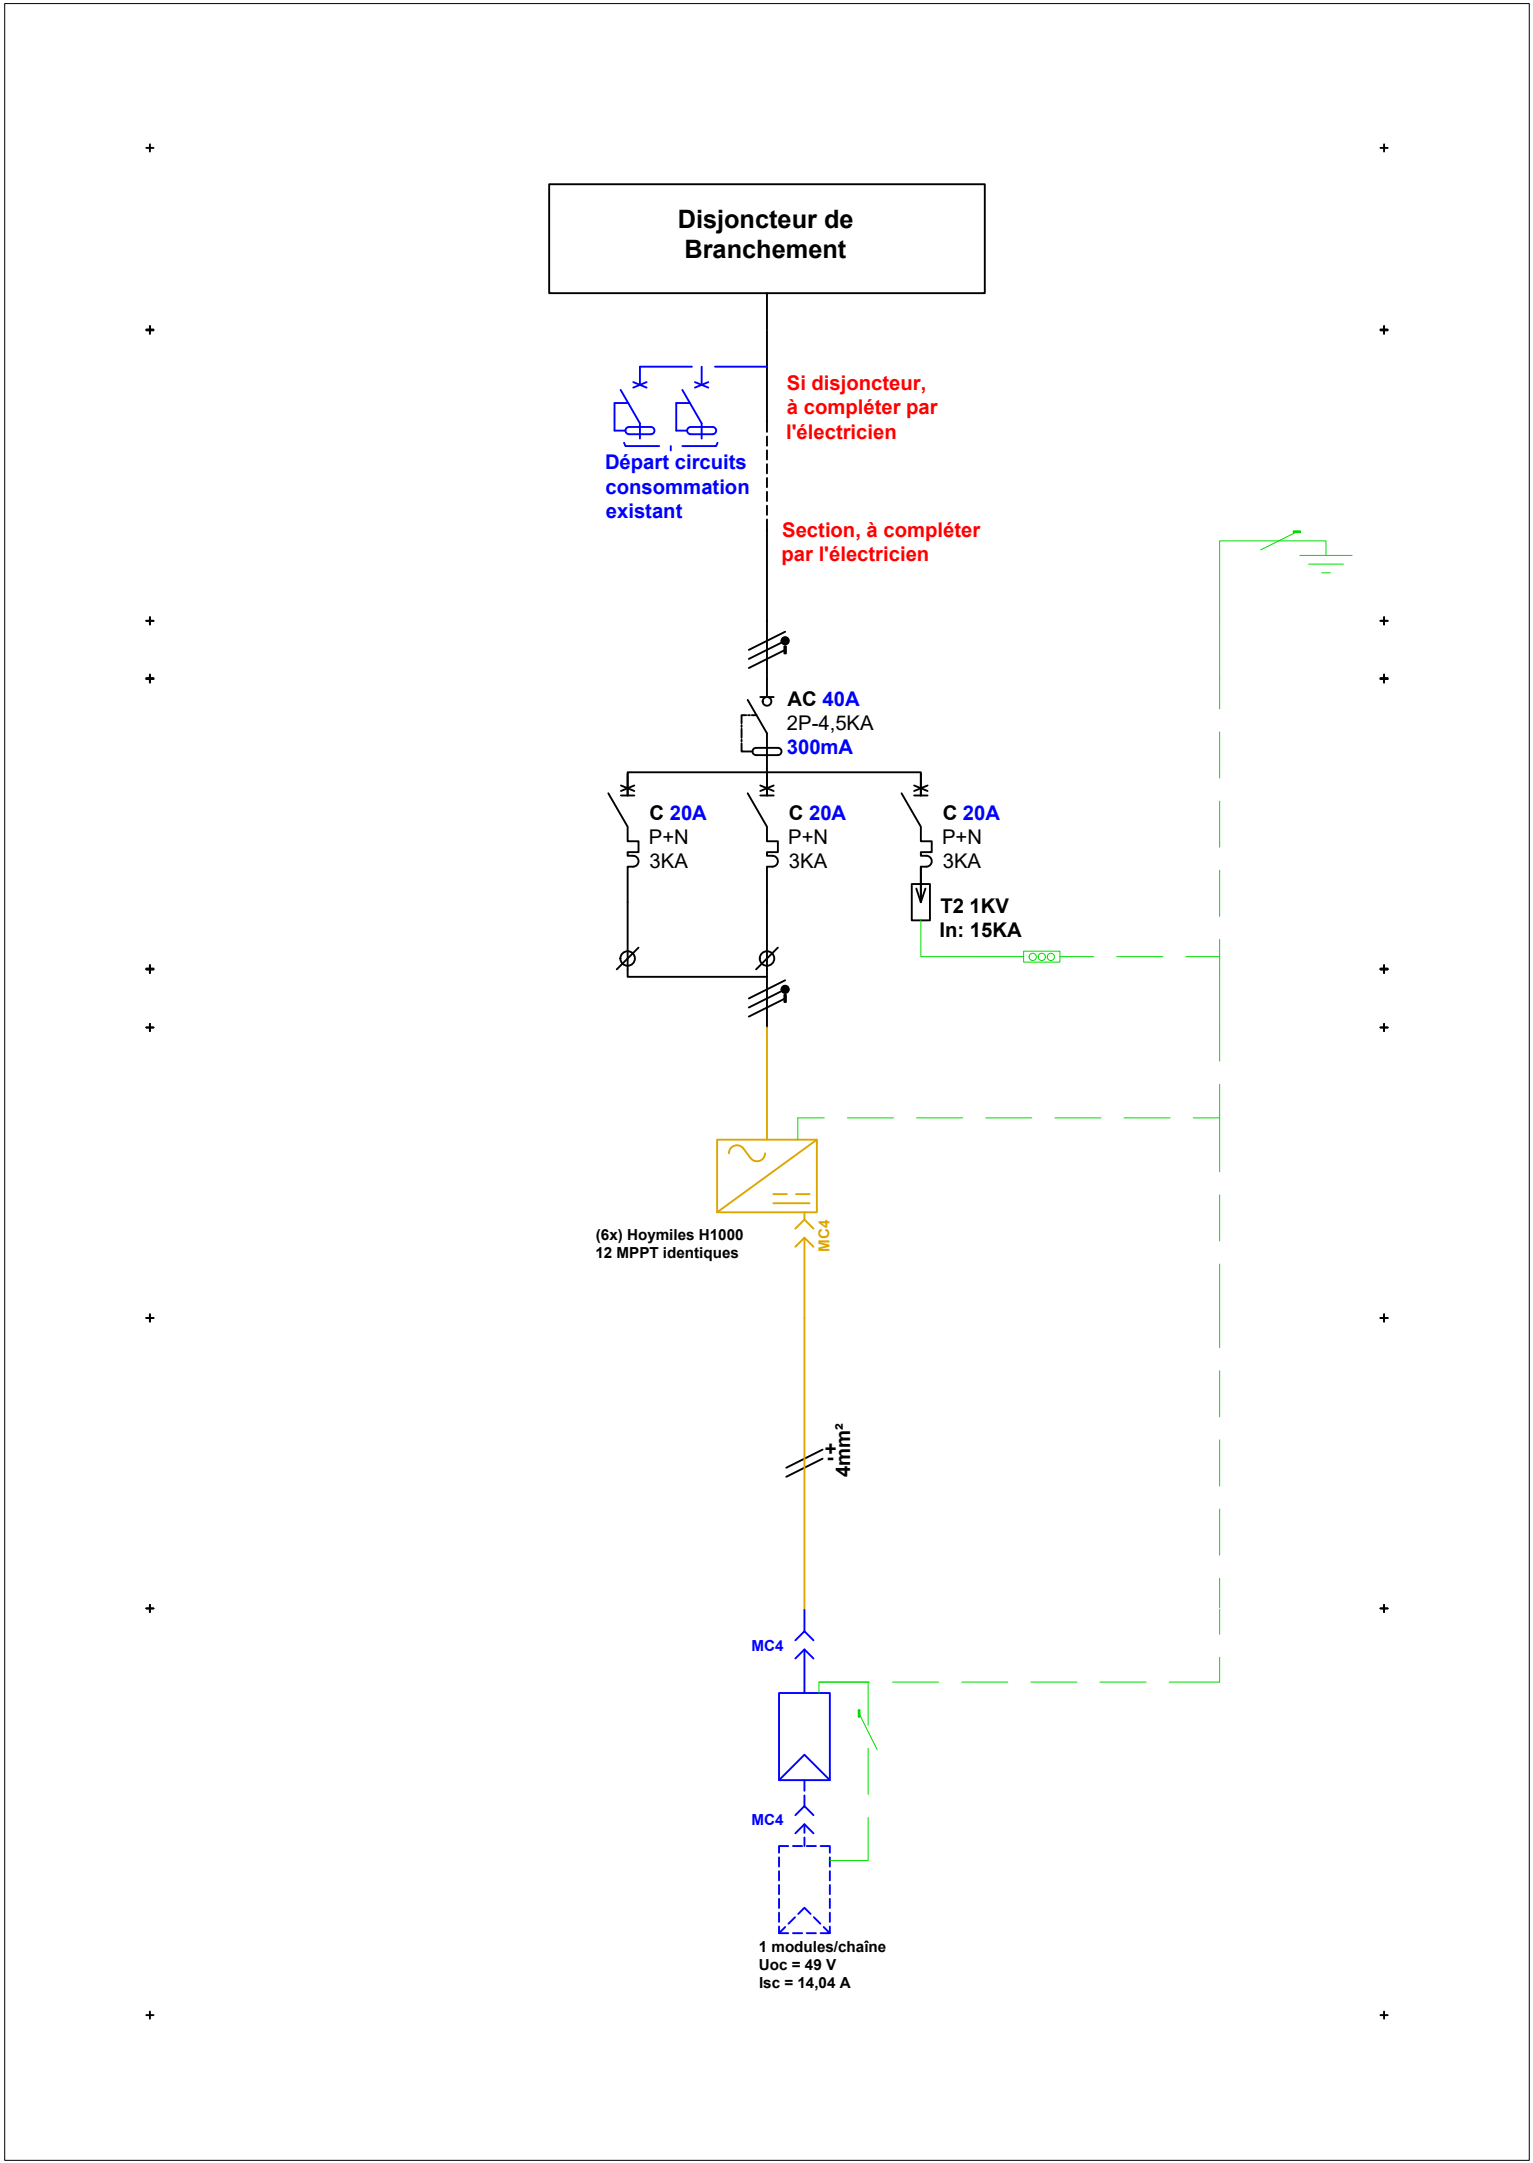

Modules :		(12x) DMECG 500Wc 6,000 kWc		Pmpp :	500Wc	Uoc (-15°C) :	49 V	Isc :	14,04 A
Partie DC	(1) Module PV: Le soussigné confirme que les modules sont conformes aux normes de la série NF EN 61730		12 tuiles PV		(6000 Wc)				
	Nombre de chaines en // :		1 (chaîne de 1)	Isc max générateur :	14,04 A	Uoc max :	49 V		
	(2) Câble Principal PV :		Section :	4 mm²	U :	1500 Vcc	T° admissible sur âme :	120 °C	
	(3) Interrupteur Sectionneur général DC :		Un :			In :	☒	Sans objet : Installation avec micro-onduleurs	
	(4) Polarité à la terre :		☒ Non	☐ Oui	Si oui, le soussigné s'engage sur la présence d'une séparation galvanique				
	(5) Onduleur :		Si micro-onduleurs / multi-tracker / optimiseur -> Nombre de générateurs identiques :					12	
Partie AC	Marque et modèle :		HMS 1000 HOYMILES			<i>Joindre le certificat de conformité à la PRENOME DIN VDE 0126-1-1/A</i>			
	Système Découplage :		☐ Externe	☒ Intégré à l'onduleur					
	(6) Branchement :		☒ Puissance limitée		☐ Puissance surveillée				
